

MODULINIŲ PASTOLIŲ PRIĖMIMO / GRAŽINIMO TAISYKLĖS

- Priimdami pastolius, būtina suskaičiuokite įrangos vienetus pagal akte nurodytus kiekius:

TRANSRIFUS
 UAB "TRANSRIFUS" Liepų g. 34a, Garliava Kauno raj. Į/k 160417519, tel. (37)337410, faks. (37)337411

Įrenginių perdavimo aktas prie sutarties: SUT -00031-13-04-29 Nr. PAST -0-0
 Data: 2016.06.09- 15:06:36

Nuomininkas: Dienes Pirkėjas Įm. Kodas: 123456789
 Tel.: - Adresas: -
 Atsakingas asmuo: - , - , tel.: -

Perduodama įranga		Moduliai 70mx2			
Artikulas	Pavadinimas	Kiekis	Svoris Kg	Viso Kg	Kaina Eur be PVM
e371420	Pagrindinis stovas 2m su antgaliu	54	9.4	507.6	1,728.00
e372410	Horizontalė 1.09m U formos	24	6.1	146.4	672.00
e371810	Horizontalė 1.09	24	4.1	98.4	432.00
e371830	Horizontalė modul 3.07	92	10.3	947.6	2,944.00
e491330	Paklotas plieninis 3.07x0.32 U	69	20	1380	3,519.00
e373130	Išstrižinė mod 3.07x2	5	12.6	63	180.00
e511204	Reguliuojama koja	54	2.9	156.6	756.00
e581319	Spyna sukama 48/48	5	1.5	7.5	35.00
			3307.1	10,266.00	

- Priėmus įrangą, apie neatitikimus ir defektus prašome informuoti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Vėliau pretenzijos nebus priimamos.
- Prie įrangos grąžinimo akto būtina pridėti **krovinio važtaraštį** su suskaičiuotais kiekiais.

TRANSRIFUS

Įrangos grąžinimo aktas. Data: 2016 05 25
 Nuomininkas: Juozas Pavolius Laikas: _____

DETALĖS PAVADINIMAS	GRĄŽINTA
PAGRINDINIS STOVAS 3 m	
PAGRINDINIS STOVAS 2 m	12
PAGRINDINIS STOVAS 1 m	5
PAGRINDINIS STOVAS 0,5 m	
HORIZONTALĖ O 0,73 m	
HORIZONTALĖ O 1,09 m	14
HORIZONTALĖ O 3,07 m	
HORIZONTALĖ O 2,57 m	
HORIZONTALĖ U 0,73 m	
HORIZONTALĖ U 1,09 m	6
HORIZONTALĖ SUSTIPRINTA U 2,57 M	

- Išduotos įrangos **NEGALIMA** pjaustyti, įpjauti, gręžti ar kitaip paveikti mechanškai. Pagal gamintojo reikalavimus pastoliai negali būti remontuojami. Jei nesilaikoma šio punkto, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Montuotojas padengtų visą sugadintos detalės vertę.

Pastoliai kraunami į transportą:

- Pagrindiniai stovai (3 m, 2 m, 1 m, 0,5 m) dedami į sandėliavimo stovus po 60 vnt. Dedama taip, kad sandėliavimo stovus būtų galima sukrauti viena ant kito. Dedant skirtingo ilgio pagrindinius stovus į vieną saugojimo stovą, juos atskirti skersiniais. Taip kad atskirų ilgių pagrindinius stovus būtų galima krauti šakiniais keltuvais.



- **Ilgosios horizontalės ir turėklai** (3,07 m, 2,57... 1,57 m) dedamos į sandėliavimo stovus (iki 120 vnt). **Istrižainės** dedamos ant viršaus (iki 100 vnt), atskyrus skersiniais. Dedant skirtingų ilgių horizontales ir turėklus, jas atskirti skersiniais.
- Be saugojimo stovo, visas vamzdines detales dėti tvarkingai į vieną vietą po skersiniais. Esant poreikiui – surišti su diržais, kraunant daugiau nei 1 aukštą, atskirti skersiniais.



- **Paklotai** kiekvienas aukštas vartomas skirtinga puse. Taip kad paklotai susidėtų vieni į kitus. Dedama 12 vnt į viršų ir 3 vnt į plotį. Esant didesniai kiekiui dedami skersiniai ir kraunamas antras aukštas. Aikštelės dedamos viršuje.



- Paklotai su kabliais kraunami trimis eilėmis, vienas ant kito, po 15 vnt. į viršų.



- **Borto lentos** dedamos 10 vnt. į viršų ir 4 vnt į plotį. Esant dideliame kiekiui atskirti skersiniais.



- **Smulkios detalės** kraunamos į dėžes. Dedant ant paletės, apsukamos plėvele. Visos atskiros dalys turi būti nuardytos.



Papildomos sąlygos

- **Pastoliai pakraunami ir iškraunami tik krautuvu** iki 16.00 val. darbo dienomis. Jei pastoliai atvežami/išvežami autobusu, mikroautobusu ar kitomis nepritaikytomis transporto priemonėmis, iš kurių pastolius reikia iškrauti/pakrauti rankomis, klientas pats pasirūpina darbininkais – krovėjais, kurie iškrauna/pakrauna krovinį.
- Dėl tokio pakrovimo /iškrovimo su UAB „Transrifus“ darbuotojais būtina susiderinti iš anksto.



- Norint pasinaudoti Nuomotojo transporto paslaugomis grąžinant įrangą, prašome pranešti prieš 2 darbo dienas. Pranešti ar tai bus pilnas, ar dalinis grąžinimas telefonu (nurodytas pastolių akto apačioje, kairėje pusėje) arba el. paštu pastoliai@transrifus.

Objektas: Neveronys

Perdavė:

Vytenis Kulakauskas


Statybinės įrangos nuomos vadovas

862020180

- Nuomotojas pastolių detales suskaičiuoja ir defektuoja per 5 d. d. arba kitą protingą laiką nuo jų pridavimo dienos. Apie sugadintas trūkstamas detales, Montuotojas informuojamas telefonu arba el. paštu, jei nesutarta kitaip. Negrąžintos arba sugadintos detalės yra parduodamos pagal UAB Transrifus priėmimo – perdavimo akte nurodytas kainas, jei nesutarta kitaip.
- Jei **įranga grąžinama nešvari**, Montuotojo atsakingi asmenys tokį grąžinimą nufotografuoja ir nedelsiant informuoja Montuotoją. Šie elementai netikrinami ir nevalomi, tol kol nesuderinamas reikalingų darbų apmokėjimas. Nuomotojas turi teisę, netvarkingai sukrautų ir nevalytų elementų nepriimti. Kai grąžinimui naudojamas Montuotojo transportas, vairuotojas turi teisę neleisti pakrauti mašinos, kai grąžinama įranga netvarkinga ir nevalyta prieš tai to nesuderinus.

Papildomų paslaugų įkainiai (be PVM):

Pastolių valymas 1 val. – 20 Eur.

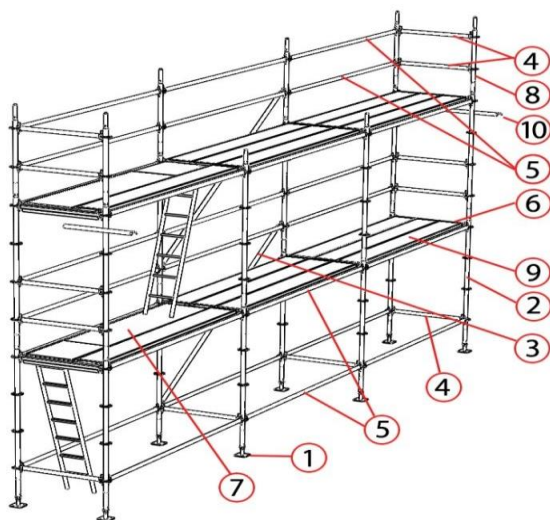

Modulinių pastolių pagrindinių detalių pavadinimai

- Reguliuojama koja.
- Pagrindinis stovas 2 m.
- Įstrižainė 3,07x2 m, 2,57x2 m, 2,07x2 m.
- Horizontalė O 1,09 m, 0,73 m.
- Horizontalė O 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m, 1,57 m.
- Horizontalė U 1,09 m, 0,73 m.
- Atidaroma aliuminė aikštelė 3,07 m, 2,57 m.
- Pagrindinis stovas 1 m.
- Plieninis paklotas 3,07 m, 2,57 m, 2,07 m.
- (Ankerinis tvirtinimas) Ankeris, pastolių laikiklis, kampinė spyna.



Įrangos grąžinimo aktas.
Nuomininkas:

Data: 2023 _____
Laikas: _____

DETALĖS PAVADINIMAS	GRAŽINTA		
PAGRINDINIS STOVAS 3 m			
PAGRINDINIS STOVAS 2 m			
PAGRINDINIS STOVAS 1 m			
PAGRINDINIS STOVAS 0,5 m			
HORIZONTALĖ O 0,73 m			
HORIZONTALĖ O 1,09 m			
HORIZONTALĖ O 3,07 m			
HORIZONTALĖ O 2,57 m			
HORIZONTALĖ U 0,73 m			
HORIZONTALĖ U 1,09 m			
HORIZONTALĖ SUSTIPRINTA U 2,57 M			
HORIZONTALĖ SUSTIPRINTA U 3,07 M			
ĮSTRIŽAINĖ MOD. 3,07 x 2 m			
ĮSTRIŽAINĖ MOD. 2,57 x 2 m			
ATIDAROMA ALIUMINĖ AIKŠTELĖ 3,07x0,61			
ATIDAROMA ALIUMINĖ AIKŠTELĖ 2,57x0,61			
AIKŠTELĖ PLIENINĖ 2,57X0,61 ATIDAROMA			
PLIENINIS PAKLOTAS U 3,07 x 0,32			
PLIENINIS PAKLOTAS U 2,57 x 0,32			
PLIENINIS PAKLOTAS U 2,07 x 0,32			
PLIENINIS PAKLOTAS 2,57 x 0,32 SU KABLIU			
STARTO ELEMENTAS			
REGULIUOJAMA KOJA 0,4 m			
KOPĖČIOS			
PASTOLIŲ LAIKIKLIS			
KAMPINĖ SPYNA			
SUKAMA SPYNA			
ANKERIS			
VAMZDIS			

Perdavė:

Priėmė:
